上板町橋梁長寿命化修繕計画

令和７年２月

上板町　建設課

目　次

1. 橋梁長寿命化修繕計画とは　・・・・・・・・・・・・・・・・・1

2. 橋梁長寿命化修繕計画づくり　・・・・・・・・・・・・・・・・2

3. 橋梁長寿命化修繕計画の効果　・・・・・・・・・・・・・・・・5

4. 今後の取り組み　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

別添：橋梁一覧表

1. 橋梁長寿命化修繕計画とは

～維持管理手法の転換～

上板町では２３６橋の道路橋（以下、橋という）の管理を行っています。これらの橋は古くから地域の発展とともに建設が進められてきたものであり、老朽化が進行しています。

このような老朽化した橋に対して、これまでは大きな損傷が発生してから修繕を行う「対処療法的な維持管理」を行ってきました。

橋梁長寿命化修繕計画とは、従来の対処療法的な維持管理手法を転換し、大きな損傷が発生する前に早めに手当てを行う「予防保全的な維持管理」を計画的に行うことをいいます。

上板町では、計画的に「予防保全的な維持管理」を行うことにより、橋の手当てにかかる費用の最小化を図り、安全性や信頼性を確保していきます。

維持管理方法による違い	
対症療法的な維持管理	 損傷が大きくなった時点で、安全性に影響が及ぶ前に手当てを行う方法です。 手当てを行うためには多くの費用がかかります。 長期間の通行止めや通行規制が必要となります。
予防保全的な維持管理	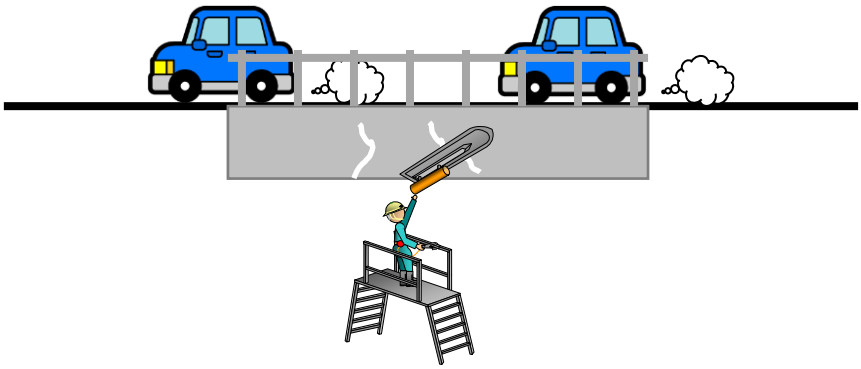 損傷が小さなうちに、早めの手当てを行う方法です。 少ない費用で手当てを行うことができます。 短期間の通行止めや通行規制が必要となりますが、手当ての方法によってはこれらの規制がなくなります。

2．橋梁長寿命化修繕計画づくり

～計画期間～

長寿命化計画期間は、５年に１回の定期点検サイクルを踏まえ、点検間隔が明らかとなるよう５年としており、今回で第３期目の計画期間となります。なお、計画内容については、計画期間内においても必要に応じ更新を行います。

～対象とする橋と老朽化の状況～

長寿命化計画の対象となる橋は、町が管理する２３６橋すべてを対象とします。橋長とカルバートの内訳は以下のとおりです。

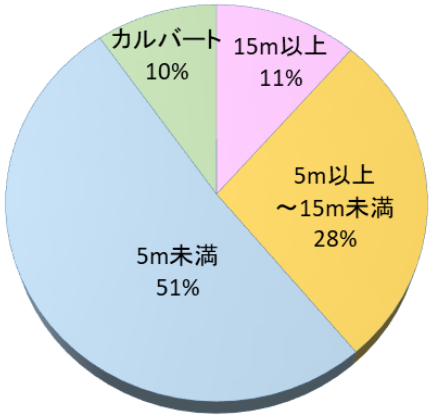

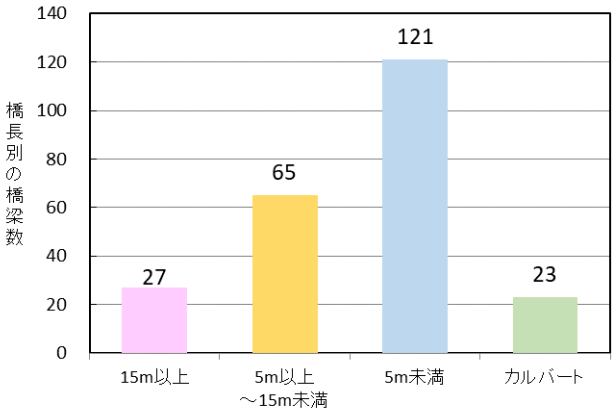

対象となる橋については令和６年時点で建設後５０年が経過する橋の数は１４７橋となっており、今後２０年で２０９橋にまで増大します。一般的に古い基準で建設された橋の耐用年数は５０～６０年とも言われているため、今後、高齢化が進む橋を適切に維持・管理していくことが求められます。

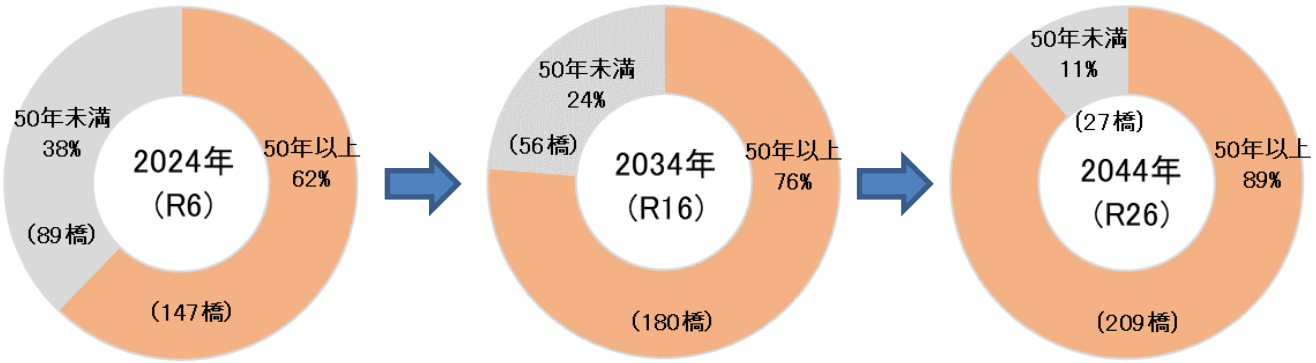

〔注〕建設年次が不明な橋は、航空写真等での推定年次となっています。

～老朽化対策の基本方針～

定期点検による健全性診断の判定区分（Ⅰ～Ⅳ）に基づき、修繕等の措置を実施します。健全性Ⅳ（緊急措置段階）では、直ちに措置を実施することとし、健全性Ⅲ（早期措置段階）では、早期（次回点検までの概ね５年以内）に措置を実施することとします。健全性Ⅱ（予防保全段階）において、小規模な修繕を行うことで中長期的に費用の縮減が可能となるような場合には、修繕を行います。

区　分		状　　態	管理水準
Ⅰ	健　　全	橋の機能に支障が生じていない状態	管理水準以上
Ⅱ	予防保全段階	橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態	
		▽目標管理水準	
Ⅲ	早期措置段階	橋の機能に支障が生じる可能性があり、 早期に措置を講ずべき状態	管理水準以下
		▽限界管理水準	
Ⅳ	緊急措置段階	橋の機能に支障が生じている， 又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態	

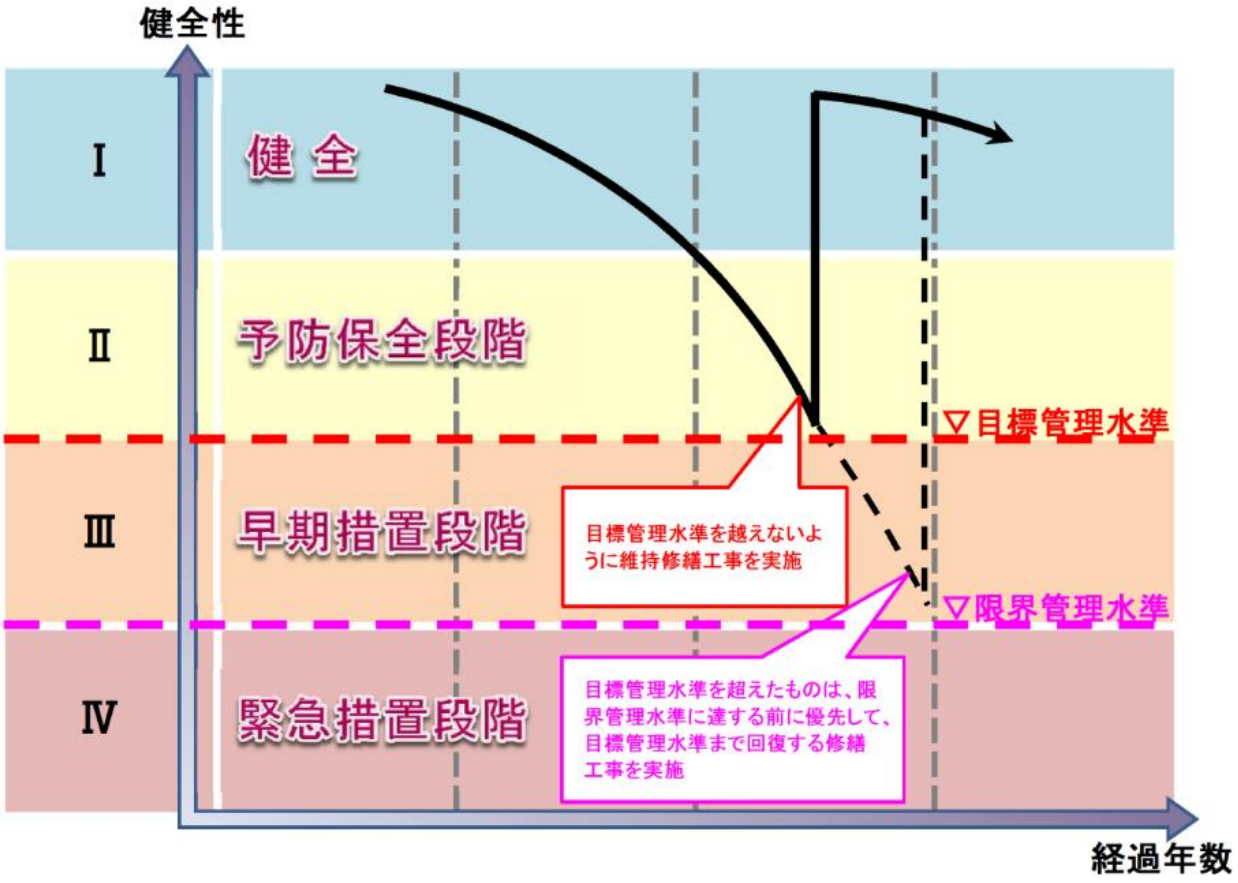

～優先的に修繕する橋の考え方～

町が管理する橋には、大小様々な規模の橋があります。これらの橋を同じように管理した場合、多くの費用が必要となり町の財政を圧迫するだけでなく、橋の数が多いことから、手当てを必要とする橋への対応が遅れることも考えられます。

こうしたことから、定期点検からわかる橋の損傷具合や、橋の重要性などを考慮し、優先的に修繕していく順番を決定していきます。

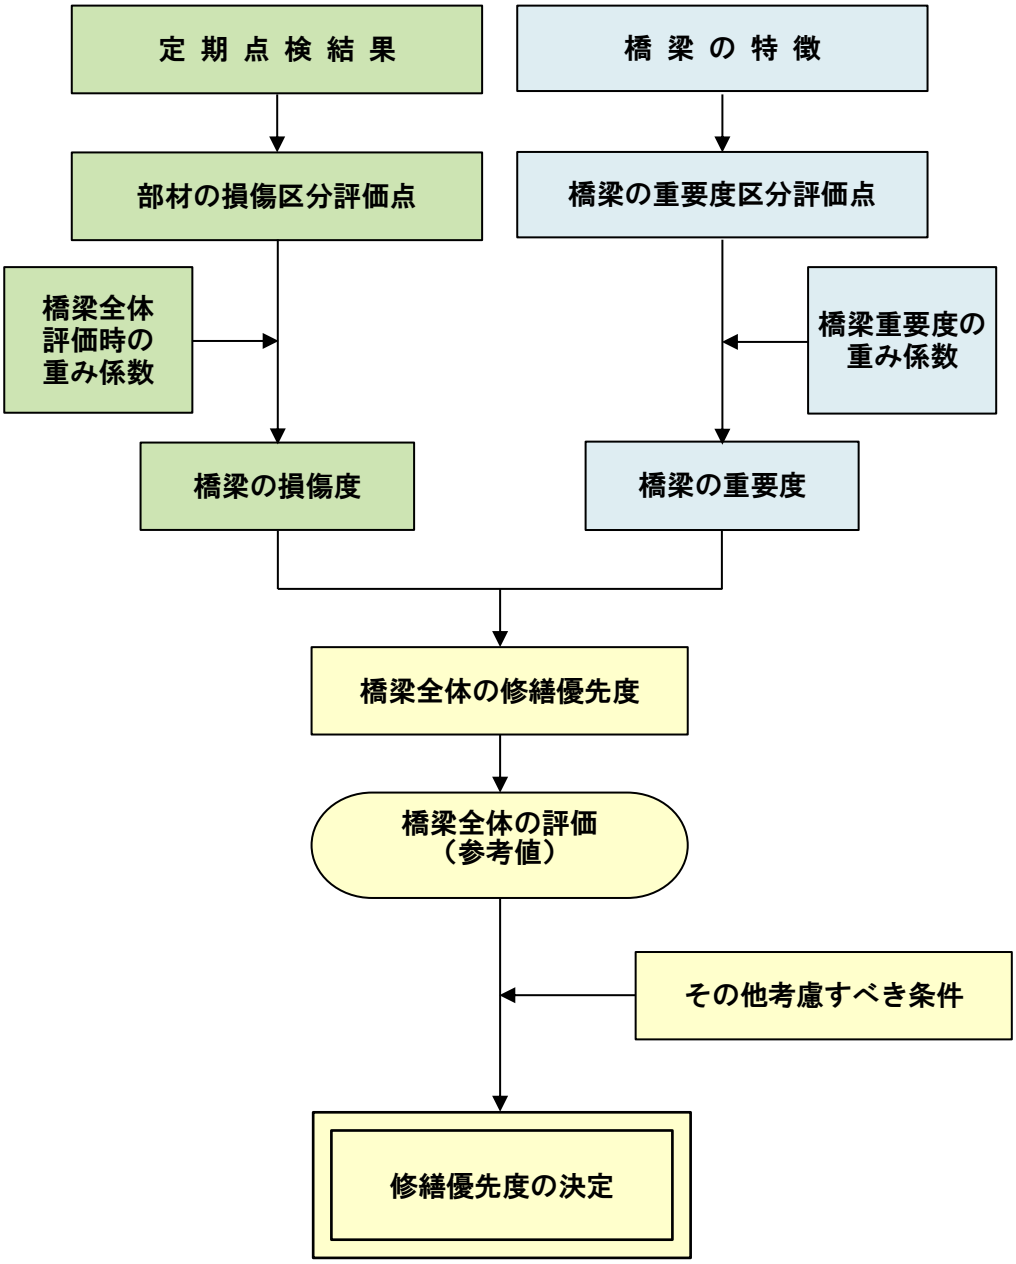

3．橋梁長寿命化修繕計画の効果

～費用の縮減～

橋梁長寿命化修繕計画では、橋を可能な限り長持ちさせることを目標としています。今後３０年間で、選定した２３６橋の手当てにかかる費用の額は、従来の対症療法的な維持管理で約１７．１億円となるのに対して、予防保全的な維持管理を継続的に実施していくことで約１０．２億円にも縮減できるとの試算となり、大幅な費用の縮減が期待されます。

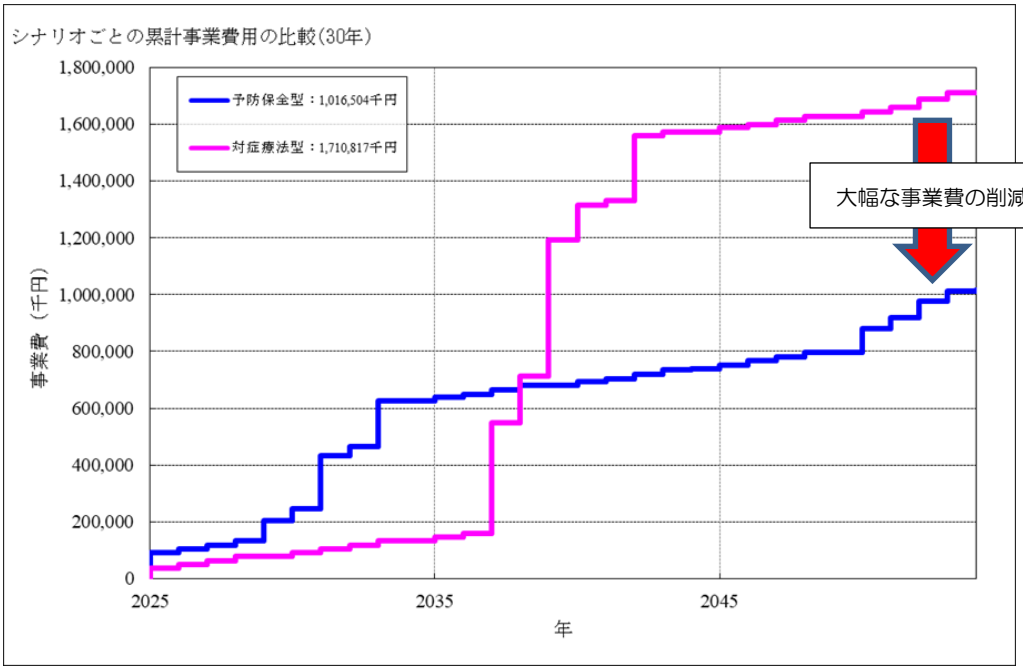

～安全な通行を確保します～

大幅に費用を削減しても、早め早めの手当てによって橋を長持ちさせることができるため、これからも橋の安全な通行を確保することができます。

対症療法的な維持管理を行った場合

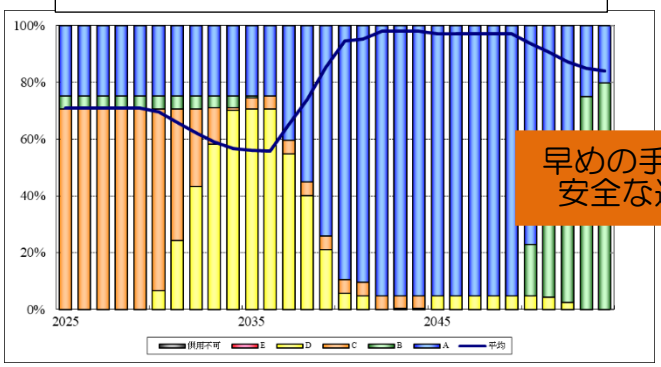

早めの手当てにより
安全な通行を確保

予防保全的な維持管理を行った場合

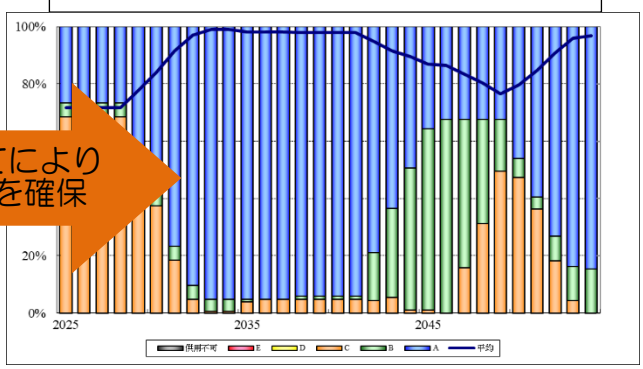

４．今後の取り組み

～継続的な取り組み～

町職員や専門家などが連携して、橋を効率的に点検・管理し、手当てに必要な費用の縮減に努めながら、橋の安全を確保します。
点検・補修の予定については、別添橋梁一覧表に掲載しています。

～新たな取り組み～

厳しい財政状況や技術者不足といった制約の中で、今後、橋の老朽化対策に適切に対処していくため、新たに以下の取り組みを実施します。

①新技術の活用

２０２９年（令和１１年）までの５年間に、定期点検ならびに修繕工事において、管理する２３６橋のうち、約１割の橋梁で新技術を活用した工期短縮や環境対策を図り、従来技術と比較して約２８０万円の費用縮減を目指します。

②集約化・撤去等

今回の長寿命化計画期間内に実施する定期点検内において、周辺環境の変化等により集約化が可能な橋を抽出し、「５年間で１橋程度の集約化」を検討します。これにより、将来の維持管理コストを２００万円程度縮減することを目指します。

～計画づくりを担当しました～

〒７７１－１３９２　徳島県板野郡上板町七條字経塚４２番地
上板町　建設課（上板町役場　１Ｆ）
電話番号　（０８８）６９４－６８１２
電子メールでのお問い合わせ　ke@kamiita.i-tokushima.jp

（更新履歴）

令和３．６．　１更新
令和５．２．　９更新
令和５．３．２４更新（一覧表修正）
令和６．３．１１更新（一覧表更新）
令和７．２．２８改訂
令和８．５．２０更新（一覧表更新）

〒７７１－１３９２　徳島県板野郡上板町七條字経塚４２番地
ＴＥＬ：（０８８）６９４－３１１１　http://www.townkamiita.jp/

橋梁一覧表（備考欄の★印は橋梁長寿命化修繕計画にて優先的に手当てする橋梁として選定した橋梁）

橋梁名	路線名	架設年（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	所在地	直近の点検結果		次回点検の時期					補修の時期	主な補修内容	概算事業費（千円）	備考
							年度	判定区分	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）				
町道2号橋	町道1号線	不明	4.6	3.6	③RC橋_RC中実床版	上板町瀬部字瀬部	2025	Ⅰ					○	－	－	－	★
町道3号橋	町道1号線	不明	6.8	3.0	③RC橋_RC　T桁	上板町七條字古町	2025	Ⅱ					○	R10	主部材・橋台補修	476	★
町道5号橋	町道1号線	2001	56.0	10.5	④PC橋_プレテンT桁	上板町七條字橋本	2025	Ⅱ					○	R9	主部材・橋台・橋脚補修	10,691	★
町道6号橋	町道1号線	2009	4.7	11.3	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字由留条	2025	Ⅰ					○	－	－	－	★
町道7号橋	町道1号線	2009	2.1	11.2	③RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）	上板町七條字由留条	2025	Ⅰ					○	－	－	－	★
町道10号橋	町道1号線	1990	29.5	5.0	④PC橋_ポステンT桁	上板町神宅字川原田	2025	Ⅱ					○	R8	主部材・橋台補修	3,372	★
町道11号橋	町道2号線	2003	47.9	10.0	④PC橋_プレテン中空床版	上板町七條字大池	2025	Ⅱ					○	－	【補修済】	－	★
町道12号橋	町道3号線	不明	5.2	4.3	③RC橋_RC中実床版	上板町引野字竹重	2025	Ⅰ					○	－	－	－	★
町道13号橋	町道3号線	不明	8.0	5.7	③RC橋_RC中実床版	上板町引野字泉野東	2025	Ⅱ					○	R9	主部材補修	611	★
町道14号橋	町道3号線	不明	4.6	5.4	③RC橋_RC中実床版	上板町引野字正明寺	2025	Ⅰ					○	－	－	－	★
町道16号橋	町道4号線	1980	63.0	9.0	④PC橋_プレテンT桁	上板町西分字桜ノ木	2022	Ⅱ		○				－	【補修済】	－	★
町道17号橋	町道4号線	1981	17.9	9.0	④PC橋_プレテン中空床版	上板町西分字切原	2021	Ⅱ	○					－	【補修済】	－	★
町道18号橋	町道4号線	不明	6.7	5.2	③RC橋_RC中実床版	上板町西分字滝ノ宮	2025	Ⅰ					○	－	－	－	★
町道20号橋	町道5号線	不明	2.9	4.6	③RC橋_RC中実床版	上板町高瀬字天上開	2025	Ⅰ					○	－	－	－	★
町道21号橋	町道5号線	1986	22.0	5.0	③RC橋_RC　T桁	上板町高磯字高柳	2025	Ⅱ					○	R8	主部材・橋台・橋脚補修	4,003	★
町道22号橋	町道5号線	不明	3.1	4.2	③RC橋_RC中実床版	上板町上六條字北開	2025	Ⅱ					○	－	経過観察	－	★
町道23号橋	町道5号線	不明	2.0	4.1	③RC橋_RC床版橋（その他）	上板町上六條字北開	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	★
町道24号橋	町道6号線	不明	12.6	6.9	④PC橋_プレテン中空床版	上板町神宅字宮ヶ谷	2025	Ⅰ					○	－	－	－	★
町道25号橋	町道6号線	1994	10.3	7.5	③RC橋_RC中実床版	上板町神宅字宮ヶ谷	2025	Ⅰ					○	－	－	－	★
町道26号橋	町道6号線	不明	3.4	2.5	③RC橋_RC中実床版	上板町神宅字大山	2025	Ⅰ					○	－	【補修済】	－	★
町道27号橋	町道7号線	不明	2.4	4.4	③RC橋_RC中実床版	上板町泉谷字西山田	2025	Ⅰ					○	－	－	－	★
町道28号橋	町道8号線	1988	18.6	4.3	④PC橋_プレテンT桁	上板町神宅字神宮寺	2025	Ⅰ					○	－	－	－	★
町道29号橋	町道9号線	1973	17.7	4.8	④PC橋_プレテン中空床版	上板町西分字滝ノ宮西	2025	Ⅰ					○	－	－	－	★
町道31号橋	町道10号線	不明	2.2	3.6	③RC橋_RC中実床版	上板町高瀬字天上開	2025	Ⅰ					○	－	－	－	★
町道32号橋	町道10号線	不明	8.7	4.3	④PC橋_プレテン床版	上板町高瀬字天上開	2025	Ⅱ					○	R9	主部材・橋台・橋脚補修	1,253	★
町道33号橋	町道10号線	不明	8.7	4.7	④PC橋_プレテン床版	上板町七條字挽木	2025	Ⅱ					○	R9	主部材・橋台補修	1,440	★
町道34号橋	町道10号線	不明	4.1	3.1	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字北高瀬	2025	Ⅰ					○	－	－	－	★
町道35号橋	町道10号線	2018	46.0	4.0	④PC橋_プレテンT桁（合成）	上板町七條字北高瀬	2021	Ⅱ	○					－	【補修済】	－	★
町道36号橋	町道10号線	不明	2.3	7.5	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字杉ノ内	2025	Ⅱ					○	R10	主部材補修	222	★
町道37号橋	町道10号線	不明	5.0	5.0	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字蔵ノ前	2025	Ⅰ					○	－	－	－	★
町道38号橋	町道12号線	不明	2.5	4.0	③RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）	上板町高瀬字国仲	2025	Ⅰ					○	－	－	－	★
町道39号橋	町道12号線	不明	2.0	5.4	③RC橋_RC中実床版	上板町瀬部字瀬部	2025	Ⅰ					○	－	－	－	★
町道40号橋	町道13号線	不明	2.8	4.5	③RC橋_RC中実床版	上板町瀬部字西井内	2025	Ⅰ					○	－	－	－	★
町道41号橋	町道15号線	不明	4.3	6.0	③RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）	上板町瀬部字樫山	2025	Ⅰ					○	－	－	－	★
町道42号橋	町道15号線	不明	2.4	6.1	③RC橋_RC中実床版	上板町瀬部字樫山	2025	Ⅰ					○	－	－	－	★
町道43号橋	町道16号線	1981	38.0	7.2	①鋼橋(ボルト又は鋼溶継手)_I桁（合成）	上板町神宅字西ノ岡	2025	Ⅱ					○	R7～9	【R7設計完了】	93,000	★
町道44号橋	町道16号線	不明	2.5	8.8	③RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）	上板町神宅字山田	2025	Ⅰ					○	－	－	－	★
町道45号橋	町道16号線	1979	30.0	7.0	①鋼橋(ボルト又は鋼溶継手)_I桁（合成）	上板町神宅字喜来	2025	Ⅰ					○	－	【補修済】	－	★
町道46号橋	町道16号線	1981	18.7	7.0	④PC橋_プレテンT桁	上板町神宅字前田	2025	Ⅰ					○	－	－	－	★
町道47号橋	町道16号線	不明	5.4	7.0	③RC橋_RC中実床版	上板町神宅字前田	2025	Ⅰ					○	－	－	－	★
町道48号橋	町道16号線	1980	27.0	7.0	④PC橋_ポステンT桁	上板町神宅字滝ヶ山	2025	Ⅱ					○	R8	主部材・橋台補修	4,034	★
町道49号橋	町道16号線	不明	12.5	7.0	④PC橋_プレテン床版	上板町引野字上歯朶乃尾	2025	Ⅰ					○	－	－	－	★
町道50号橋	町道16号線	不明	8.5	7.0	④PC橋_プレテン床版	上板町引野字前坂口	2025	Ⅰ					○	－	－	－	★
町道51号橋	町道16号線	不明	4.1	7.0	③RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）	上板町引野字引野屋敷東	2025	Ⅰ					○	－	－	－	★
町道52号橋	町道331号線	不明	4.7	7.0	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字栗ノ木前	2025	Ⅰ					○	－	－	－	
町道53号橋	町道36号線	不明	14.8	2.6	③RC橋_RC中実床版	上板町下六條字新田	2025	Ⅱ					○	－	経過観察	－	
町道55号橋	町道51号線	不明	2.8	6.6	③RC橋_RC中実床版	上板町椎本字寺ノ前	2025	Ⅰ					○	－	－	－	
町道56号橋	町道60号線	不明	3.2	3.9	③RC橋_RC中実床版	上板町椎ノ本字中ノ内	2025	Ⅰ					○	－	－	－	
町道57号橋	町道60号線	不明	2.4	8.9	③RC橋_RC中実床版	上板町椎ノ本字中ノ内	2025	Ⅰ					○	－	【補修済】	－	
町道58号橋	町道61号線	不明	4.9	2.5	③RC橋_RC中実床版	上板町椎本字中ノ内	2025	Ⅰ					○	－	－	－	
町道59号橋	町道61号線	不明	2.9	6.8	③RC橋_RC中実床版	上板町椎本字中ノ内	2025	Ⅰ					○	－	－	－	
町道60号橋	町道67号線	不明	3.8	4.5	③RC橋_RC中実床版	上板町西分字西ツメノ	2025	Ⅰ					○	－	－	－	
町道61号橋	町道68号線	不明	3.4	3.9	③RC橋_RC中実床版	上板町椎ノ本字西窪北	2025	Ⅰ					○	－	－	－	
町道62号橋	町道68号線	不明	5.0	5.3	③RC橋_RC中実床版	上板町西分字原渕	2025	Ⅰ					○	－	－	－	
町道64号橋	町道71号線	不明	2.8	7.0	③RC橋_RC中実床版	上板町椎本字馬場南	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	
町道65号橋	町道71号線	不明	2.8	3.6	③RC橋_RC中実床版	上板町西分字井利東	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	
町道66号橋	町道72号線	不明	3.5	4.5	③RC橋_RC中実床版	上板町西分字立花	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	
町道68号橋	町道72号線	不明	4.0	4.7	③RC橋_RC中実床版	上板町西分字浜郷	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	
町道69号橋	町道74号線	不明	3.5	2.7	③RC橋_RC中実床版	上板町西分字原渕	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	

橋梁名	路線名	架設年（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	所在地	直近の点検結果		次回点検の時期					補修の時期	主な補修内容	概算事業費（千円）	備考
							年度	判定区分	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）				
町道70号橋	町道74号線	1965	63.9	3.6	①鋼橋(ボルト又は鋼溶継手)_H形鋼（合成）	上板町西分字立花	2021	Ⅱ	○					－	【補修済】	－	★
町道71号橋	町道78号線	不明	3.4	4.7	③RC橋_RC中実床版	上板町西分字東光	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	
町道72号橋	町道80号線	1969	60.0	3.0	①鋼橋(ボルト又は鋼溶継手)_I桁（合成）	上板町西分字正念寺	2025	Ⅱ					○	R11	主部材・床版・橋台・橋脚補修	30,286	
町道75号橋	町道81号線	不明	2.3	5.1	③RC橋_RC中実床版	上板町西分字桜ノ木	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	
町道77号橋	町道91号線	不明	2.9	4.3	③RC橋_RC中実床版	上板町椎本字東榎本	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	
町道78号橋	町道91号線	不明	2.0	2.8	③RC橋_RC中実床版	上板町椎本字野神	2021	Ⅰ	○					－	－	－	
町道80号橋	町道97号線	1995	3.5	6.7	③RC橋_RC中実床版	上板町西分字東光	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	
町道81号橋	町道108号線	不明	4.8	5.5	③RC橋_RC中実床版	上板町西分字東ツメノ	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	
町道83号橋	町道111号線	不明	3.6	3.0	③RC橋_RC中実床版	上板町西分字西ツメノ	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	
町道85号橋	町道114号線	不明	14.3	4.3	③RC橋_RC中実床版	上板町高磯字喜来	2021	Ⅲ	○					－	【補修済】	－	
町道86号橋	町道114号線	不明	2.9	4.0	③RC橋_RC中実床版	上板町高磯字高石	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	
町道88号橋	町道117号線	1951	15.0	2.8	③RC橋_RC中実床版	上板町上六條字南開	2022	Ⅲ		○				－	【補修済】	－	
町道89号橋	町道117号線	不明	2.7	4.0	③RC橋_RC中実床版	上板町上六條字北開	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	
町道91号橋	町道118号線	不明	14.1	2.6	③RC橋_RC中実床版	上板町上六條字南開	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	
町道94号橋	町道119号線	不明	14.2	4.1	④PC橋_プレテン中空床版	上板町上六條字南開	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	
町道96号橋	町道123号線	不明	2.9	5.6	③RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）	上板町高瀬字天上開	2025	Ⅰ					○	－	－	－	
町道97号橋	町道126号線	不明	2.6	2.9	③RC橋_RC中実床版	上板町高磯字高石	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	
町道99号橋	町道127号線	不明	14.1	2.6	③RC橋_RC中実床版	上板町高磯字高石	2021	Ⅲ	○					－	【補修済】	－	
町道101号橋	町道130号線	不明	3.0	4.9	③RC橋_RC中実床版	上板町高瀬字天上開	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	
町道102号橋	町道130号線	不明	2.4	3.1	③RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）	上板町高磯字高柳	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	
町道103号橋	町道133号線	不明	2.5	4.5	③RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）	上板町高瀬字天上開	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	
町道107号橋	町道138号線	2016	2.0	4.0	③RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）	上板町高瀬字天上開	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	
町道108号橋	町道142号線	不明	3.0	3.0	③RC橋_RC中実床版	上板町高瀬字国仲	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	
町道109号橋	町道142号線	不明	8.8	3.0	③RC橋_RC中実床版	上板町高瀬字国仲	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	
町道111号橋	町道147号線	不明	2.0	3.8	③RC橋_RC中実床版	上板町高瀬字天上開	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	
町道113号橋	町道154号線	不明	4.3	3.6	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字北高瀬	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	
町道114号橋	町道154号線	不明	9.0	3.8	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字北高瀬	2021	Ⅱ	○					－	【補修済】	－	
町道115号橋	町道156号線	不明	8.2	3.7	①鋼橋(ボルト又は鋼溶継手)_H形鋼（非合成）	上板町七條字粟飯久保	2021	Ⅲ	○					－	【補修済】	－	
町道116号橋	町道156号線	不明	6.0	4.1	③RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）	上板町七條字粟飯久保	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	
町道117号橋	町道157号線	不明	12.9	2.9	③RC橋_RC中実床版	上板町高瀬字国仲	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	
町道118号橋	町道157号線	不明	8.7	4.0	①鋼橋(ボルト又は鋼溶継手)_H形鋼（非合成）	上板町七條字粟飯久保	2021	Ⅱ	○					R8	主部材・橋台補修	4,247	
町道121号橋	町道158号線	不明	6.8	3.1	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字古町	2021	Ⅲ	○					－	【補修済】	－	
町道122号橋	町道159号線	不明	2.5	3.5	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字粟飯久保	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	
町道123号橋	町道160号線	不明	8.7	3.3	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字元原	2021	Ⅲ	○					－	【補修済】	－	
町道124号橋	町道161号線	不明	2.5	5.3	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字古町	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	
町道125号橋	町道161号線	不明	3.2	4.1	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字西池方	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	
町道127号橋	町道168号線	不明	2.0	4.2	③RC橋_RC中実床版	上板町高瀬字国仲	2021	Ⅱ	○					R8	主部材・橋台補修	1,017	
町道128号橋	町道168号線	不明	4.1	2.5	③RC橋_RC中実床版	上板町高瀬字国仲	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	
町道129号橋	町道169号線	不明	11.8	2.5	③RC橋_RC中実床版	上板町高瀬字国仲	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	
町道130号橋	町道169号線	不明	4.1	2.5	③RC橋_RC中実床版	上板町高瀬字国仲	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	
町道131号橋	町道169号線	不明	4.2	4.5	③RC橋_RC中実床版	上板町瀬部字瀬部	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	
町道133号橋	町道173号線	不明	3.7	2.6	③RC橋_RC中実床版	上板町高瀬字国仲	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	
町道148号橋	町道203号線	不明	3.2	4.4	③RC橋_RC中実床版	上板町瀬部字西井内	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	
町道149号橋	町道204号線	不明	2.6	4.6	③RC橋_RC中実床版	上板町瀬部字西井内	2022	Ⅰ		○				－	－	－	
町道150号橋	町道207号線	不明	3.2	3.3	③RC橋_RC中実床版	上板町瀬部字樫山	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道151号橋	町道208号線	不明	4.8	2.4	③RC橋_RC中実床版	上板町瀬部字樫山	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道152号橋	町道209号線	不明	3.4	2.7	③RC橋_RC中実床版	上板町瀬部字樫山	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道153号橋	町道210号線	不明	2.7	4.0	③RC橋_RC中実床版	上板町瀬部字樫山	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道154号橋	町道210号線	不明	2.4	5.6	③RC橋_RC中実床版	上板町瀬部字鳥屋	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道155号橋	町道211号線	不明	2.3	4.1	③RC橋_RC中実床版	上板町瀬部字鳥屋	2022	Ⅰ		○				－	－	－	
町道156号橋	町道212号線	不明	2.7	4.4	③RC橋_RC中実床版	上板町瀬部字鳥屋	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道157号橋	町道212号線	不明	2.6	7.6	③RC橋_RC中実床版	上板町瀬部字樫山	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道158号橋	町道211号線	不明	2.2	11.9	③RC橋_RC中実床版	上板町瀬部字樫山	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道159号橋	町道212号線	不明	2.9	5.3	③RC橋_RC中実床版	上板町瀬部字樫山	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道160号橋	町道212号線	不明	2.3	5.6	③RC橋_RC中実床版	上板町瀬部字樫山	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道161号橋	町道212号線	不明	2.3	5.8	③RC橋_RC中実床版	上板町瀬部字樫山	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道162号橋	町道215号線	不明	6.9	2.2	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字中井手	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道164号橋	町道220号線	不明	6.2	2.5	③RC橋_RC中実床版	上板町引野字釈迦地	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道165号橋	町道418号線	不明	9.4	4.2	①鋼橋(ボルト又は鋼溶継手)_H形鋼（不明）	上板町神宅字滝ノ宮西	2025	Ⅱ					○	－	【補修済】	－	
町道166号橋	町道222号線	不明	7.0	4.7	③RC橋_RC中実床版	上板町引野字六反地	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	

橋梁名	路線名	架設年（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	所在地	直近の点検結果		次回点検の時期					補修の時期	主な補修内容	概算事業費（千円）	備考
							年度	判定区分	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）				
町道167号橋	町道223号線	不明	6.7	4.2	③RC橋_RC中実床版	上板町引野字六反地	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道168号橋	町道225号線	不明	3.7	7.5	③RC橋_RC中実床版	上板町引野字門田	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道169号橋	町道228号線	1995	2.9	4.0	③RC橋_RC中実床版	上板町引野字ゴゼノ木	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道170号橋	町道234号線	不明	8.0	4.2	①鋼橋(ボルト又は鋼溶継手)_H形鋼（不明）	上板町引野字花屋敷	2022	Ⅲ		○				－	【補修済】	－	
町道171号橋	町道239号線	不明	7.8	3.6	③RC橋_RC中実床版	上板町引野字竹重	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道172号橋	町道242号線	不明	4.8	4.5	③RC橋_RC中実床版	上板町引野字前田	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道173号橋	町道244号線	不明	4.5	2.8	③RC橋_RC中実床版	上板町引野字長野原	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道174号橋	町道246号線	不明	3.0	2.1	③RC橋_RC中実床版	上板町引野字大畑	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道175号橋	町道252号線	不明	4.8	5.6	③RC橋_RC中実床版	上板町引野字関堀	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道176号橋	町道256号線	不明	6.9	4.1	③RC橋_RC中実床版	上板町引野字出口	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道177号橋	町道256号線	不明	5.6	5.0	③RC橋_RC中実床版	上板町引野字下歯朶之尾	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道178号橋	町道260号線	不明	5.1	4.8	③RC橋_RC中実床版	上板町引野字天神原	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道179号橋	町道261号線	不明	2.5	2.3	③RC橋_RC中実床版	上板町引野字出口	2022	Ⅰ		○				－	－	－	
町道180号橋	町道261号線	不明	5.7	2.8	③RC橋_RC中実床版	上板町引野字下歯朶之尾	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道181号橋	町道261号線	不明	10.0	3.0	①鋼橋(ボルト又は鋼溶継手)_H形鋼（非合成）	上板町引野字天神東	2023	Ⅲ			○			－	【補修済】	－	
町道182号橋	町道265号線	1989	6.4	5.0	③RC橋_RC中実床版	上板町引野字東原	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道183号橋	町道267号線	不明	3.8	6.4	③RC橋_RC中実床版	上板町泉谷字原地	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道184号橋	町道271号線	不明	5.3	4.0	③RC橋_RC中実床版	上板町泉谷字上歯朶ノ尾	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道186号橋	町道279号線	不明	4.1	3.1	③RC橋_RC中実床版	上板町泉谷字滝ヶ山	2025	Ⅰ					○	－	－	－	
町道188号橋	町道298号線	1981	37.7	5.6	④PC橋_プレテン床版	上板町神宅字堂床	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道189号橋	町道307号線	不明	4.3	4.0	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字由留条	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道190号橋	町道316号線	不明	6.2	3.1	③RC橋_RC中実床版	上板町鍛冶屋原字西北原	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道191号橋	町道317号線	不明	3.2	5.7	③RC橋_RC中実床版	上板町引野字鍛冶屋前	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道193号橋	町道321号線	不明	4.8	4.0	③RC橋_RC中実床版	上板町鍛冶屋原字居屋敷南	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道194号橋	町道327号線	不明	2.8	3.5	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字栗ノ木前	2025	Ⅰ					○	－	－	－	
町道195号橋	町道329号線	不明	3.9	6.8	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字栗ノ木前	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道196号橋	町道333号線	不明	4.3	5.0	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字由留条	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道197号橋	町道334号線	不明	3.0	4.5	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字角地	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道198号橋	町道334号線	不明	2.2	9.2	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字ろ豊	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道199号橋	町道338号線	不明	3.1	5.2	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字下原	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道200号橋	町道346号線	不明	2.0	4.5	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字泓ノ上	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道202号橋	町道348号線	不明	4.9	4.3	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字泓	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道203号橋	町道348号線	不明	3.4	5.1	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字泓	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道204号橋	町道349号線	不明	5.1	4.0	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字石橋	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道205号橋	町道349号線	不明	3.7	4.5	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字泓	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道206号橋	町道350号線	不明	4.9	4.5	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字蔵ノ前	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道207号橋	町道350号線	不明	3.0	5.1	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字蔵ノ前	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道208号橋	町道351号線	不明	4.9	4.5	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字下原	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道209号橋	町道352号線	不明	4.9	3.0	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字大池	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道210号橋	町道353号線	不明	6.2	4.2	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字大池	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道212号橋	町道368号線	不明	2.1	5.2	③RC橋_RC中実床版	上板町神宅字堂床	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道213号橋	町道709号線	不明	3.6	2.5	③RC橋_RC中実床版	上板町神宅字前田	2022	Ⅰ		○				－	－	－	
町道214号橋	町道377号線	1973	15.5	4.4	④PC橋_プレテンT桁	上板町西分字サビ	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	★
町道216号橋	町道383号線	不明	2.7	2.7	③RC橋_RC中実床版	上板町神宅字カハチノ本	2022	Ⅱ		○				R8	主部材補修	765	
町道218号橋	町道650号線	2005	2.8	11.5	③RC橋_RC中実床版	上板町神宅新宮北	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道220号橋	町道392号線	不明	2.5	3.0	③RC橋_RC中実床版	上板町西分字玉神	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道221号橋	町道402号線	1975	16.4	4.2	④PC橋_プレテンT桁	上板町西分字松木	2021	Ⅱ	○					－	経過観察	－	★
町道222号橋	町道404号線	不明	2.4	6.4	③RC橋_RC中実床版	上板町西分字山下	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道224号橋	町道412号線	不明	8.5	1.6	③RC橋_RC中実床版	上板町神宅字滝ノ宮西	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道225号橋	町道415号線	不明	6.8	3.9	③RC橋_RC中実床版	上板町神宅字祝谷	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道226号橋	町道415号線	不明	7.0	4.0	③RC橋_RC中実床版	上板町神宅字東山	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道227号橋	町道416号線	不明	9.6	4.3	①鋼橋(ボルト又は鋼溶継手)_H形鋼（非合成）	上板町神宅字滝ノ宮西	2023	Ⅲ			○			－	【補修済】	－	
町道228号橋	町道416号線	1987	6.6	4.0	③RC橋_RC中実床版	上板町神宅字東山	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道230号橋	町道426号線	不明	2.3	3.7	③RC橋_RC中実床版	上板町神宅字入徳	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道232号橋	町道438号線	不明	2.6	7.0	③RC橋_RC中実床版	上板町神宅字トンギョウ	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道233号橋	町道441号線	不明	14.5	3.0	④PC橋_プレテン中空床版	上板町神宅字神宮寺	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道234号橋	町道458号線	不明	9.2	10.2	③RC橋_RC中実床版	上板町神宅字神宮寺	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道235号橋	町道464号線	不明	5.2	4.1	③RC橋_RC中実床版	上板町神宅字日ノ谷口	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道236号橋	町道467号線	不明	13.5	3.0	④PC橋_プレテン床版	上板町神宅字神宮寺	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道237号橋	町道477号線	不明	8.1	4.0	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字元原	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	

橋梁名	路線名	架設年（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	所在地	直近の点検結果		次回点検の時期					補修の時期	主な補修内容	概算事業費（千円）	備考
							年度	判定区分	2026（R8）	2027（R9）	2028（R10）	2029（R11）	2030（R12）				
町道239号橋	町道316号線	不明	5.4	9.6	③RC橋_RC中実床版	上板町引野字出口	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道241号橋	町道486号線	不明	6.9	5.4	③RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）	上板町引野字入戸	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道242号橋	町道486号線	不明	9.1	5.6	④PC橋_プレテン床版	上板町引野字入戸	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道243号橋	町道505号線	1982	15.0	4.0	④PC橋_プレテン床版	上板町西分字松木	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道244号橋	町道522号線	不明	2.8	4.0	③RC橋_RC中実床版	上板町引野字鍛冶屋前	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道245号橋	町道522号線	不明	2.8	4.0	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字門田	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道246号橋	町道528号線	不明	5.7	4.0	③RC橋_ラーメン橋	上板町引野字泉野東	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道247号橋	町道530号線	不明	5.9	4.0	③RC橋_RC中実床版	上板町引野字宮ヶ谷	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道248号橋	町道536号線	2011	2.1	4.9	③RC橋_RC中実床版	上板町泉谷字カニハ	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道249号橋	町道542号線	不明	2.6	7.1	③RC橋_RC中実床版	上板町引野字青谷	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道250号橋	町道549号線	不明	3.7	5.3	③RC橋_RC中実床版	上板町西分字原渕	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道251号橋	町道551号線	不明	5.7	2.0	③RC橋_RC中実床版	上板町引野字関堀	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道252号橋	町道552号線	不明	5.9	2.0	③RC橋_RC中実床版	上板町引野字関堀	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道253号橋	町道560号線	不明	5.5	5.0	③RC橋_RC中実床版	上板町泉谷字鳶谷	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道254号橋	町道561号線	不明	8.5	5.1	③RC橋_RC中実床版	上板町泉谷字上歯朶之尾	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道255号橋	町道566号線	1993	37.4	4.0	⑨その他_ラーメン橋	上板町神宅字池ノ尻	2025	Ⅱ					○	R10	主部材・橋台・橋脚補修	9,574	
町道256号橋	町道587号線	1993	37.1	4.0	⑨その他_ラーメン橋	上板町神宅字祝谷	2025	Ⅱ					○	－	経過観察	－	
町道257号橋	町道253号線	不明	2.3	4.2	③RC橋_RC中実床版	上板町引野字青谷	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道258号橋	町道541号線	不明	6.6	4.0	③RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）	上板町引野字居屋敷東	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道259号橋	町道586号線	1993	37.2	4.0	⑨その他_ラーメン橋	上板町神宅字大谷	2025	Ⅱ					○	－	経過観察	－	
町道260号橋	町道573号線	1993	25.7	5.0	④PC橋_ポステン中空床版	上板町神宅字菖蒲谷	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道262号橋	町道598号線	不明	7.6	4.1	③RC橋_RC中実床版	上板町神宅字大谷	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道263号橋	町道599号線	1991	26.0	4.0	①鋼橋(ボルト又は鋼溶継手)_I桁（合成）	上板町泉谷字上下段	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道264号橋	町道602号線	不明	3.8	4.0	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字栗ノ木前	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道265号橋	町道602号線	不明	4.9	4.2	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字栗ノ木前	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
町道266号橋	町道606号線	不明	2.6	5.1	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字天王	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道267号橋	町道428号線	1991	26.5	8.0	①鋼橋(ボルト又は鋼溶継手)_I桁（合成）	上板町神宅字入徳	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道268号橋	町道613号線	2011	3.4	6.0	③RC橋_RC中実床版	上板町神宅字喜来	2025	Ⅰ					○	－	－	－	
町道269号橋	町道623号線	不明	2.5	4.9	③RC橋_RC中実床版	上板町瀬部字瀬部	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道270号橋	町道624号線	不明	2.4	4.8	③RC橋_RC中実床版	上板町瀬部字瀬部	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道271号橋	町道623号線	不明	2.4	4.7	③RC橋_RC中実床版	上板町瀬部字瀬部	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道272号橋	町道617号線	不明	5.8	3.0	③RC橋_RC中実床版	上板町引野字前坂口	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道273号橋	町道357号線	不明	3.5	6.4	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字下原	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道300号橋	町道276号線	不明	37.0	5.0	①鋼橋(ボルト又は鋼溶継手)_I桁（合成）	上板町泉谷字樫ヶ久保	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道301号橋	町道643号線	1998	2.6	7.5	③RC橋_RC中実床版	上板町西分字西須賀	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道302号橋	町道641号線	1998	4.1	7.9	③RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）	上板町神宅字ビワクビ	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道303号橋	町道389号線	1998	4.1	4.0	③RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）	上板町西分字正念寺	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道304号橋	町道80号線	1998	2.3	4.0	③RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）	上板町西分字玉神	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道305号橋	町道645号線	1998	2.3	4.0	③RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）	上板町西分字玉神	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道306号橋	町道9号線	1998	4.0	4.8	③RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）	上板町神宅字ビワクビ	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	★
町道307号橋	町道378号線	1998	2.2	4.1	③RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）	上板町神宅字神田	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道308号橋	町道630号線	1998	2.2	3.5	③RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）	上板町神宅字ワサダ	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道309号橋	町道654号線	1998	2.3	4.2	③RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）	上板町神宅字滝ノ宮	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道310号橋	町道342号線	不明	2.7	5.0	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字石橋ノ上	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道311号橋	町道655号線	不明	2.4	6.4	③RC橋_RC中実床版	上板町七條字石橋ノ上	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道312号橋	町道649号線	不明	2.4	4.7	③RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）	上板町七條字門田	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道313号橋	町道665号線	不明	2.7	9.1	③RC橋_RC中実床版	上板町鍛冶屋原字居屋敷南	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道314号橋	町道678号線	不明	3.0	6.0	③RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）	上板町椎本字中ノ内	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道315号橋	町道678号線	不明	2.3	5.9	③RC橋_RC中実床版	上板町椎本字中ノ内	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道316号橋	町道680号線	不明	13.5	4.0	④PC橋_プレテン床版	上板町西分字祝谷	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道317号橋	町道678号線	不明	3.0	5.1	③RC橋_RC中実床版	上板町椎本字椎ノ宮	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道318号橋	町道686号線	不明	6.1	5.0	③RC橋_RC中実床版	上板町鍛冶屋原字居屋敷東	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道319号橋	町道694号線	2005	2.0	5.4	③RC橋_RC中実床版	上板町引野字ゴゼノ木	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道320号橋	町道87号線	2005	2.1	5.2	③RC橋_RC中実床版	上板町西分字舟戸木	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道321号橋	町道697号線	2005	2.2	4.0	③RC橋_RC中実床版	上板町高瀬字国仲	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道322号橋	町道130号線	不明	2.8	11.8	③RC橋_RC中実床版	上板町字高磯字高石	2023	Ⅱ			○			－	経過観察	－	
町道323号橋	町道726号線	不明	3.0	4.4	③RC橋_RC溝橋（BOXカルバート）	上板町引野字門田	2022	Ⅱ		○				－	経過観察	－	
